

Rencontre SIED 70 – Enedis – entreprises du SIED 70

5 juillet 2018

 **9h45 à 10h : accueil**

 **10h à 11h : bilan des marchés en cours, constats des délais d'exécution, pistes d'amélioration**

 **11h à 12h : présentation Enedis : accès aux ouvrages/ conformité, DT DICT, etc...**

 **12h à 12h30 : questions diverses**


 **à partir de 12h 30 : buffet**


Les marchés de travaux du SIED 70

- 🏗️ **L'accord-cadre actuellement en vigueur a une durée de 6 ans**
- 🏗️ **Il s'éteindra à la fin du 6ème marché subséquent, soit le 5 mars 2019**

Les techniciens du SIED 70

- ▣ **Le département est découpé en 13 lots pour 11 titulaires de marchés**
- ▣ **Le territoire d'intervention des chargés de travaux du SIED 70 comprend 6 secteurs**
- ▣ **Un 7^{ème} technicien s'occupe de toutes la partie développement informatique des applications du SIED 70 et de la supervision des plans**

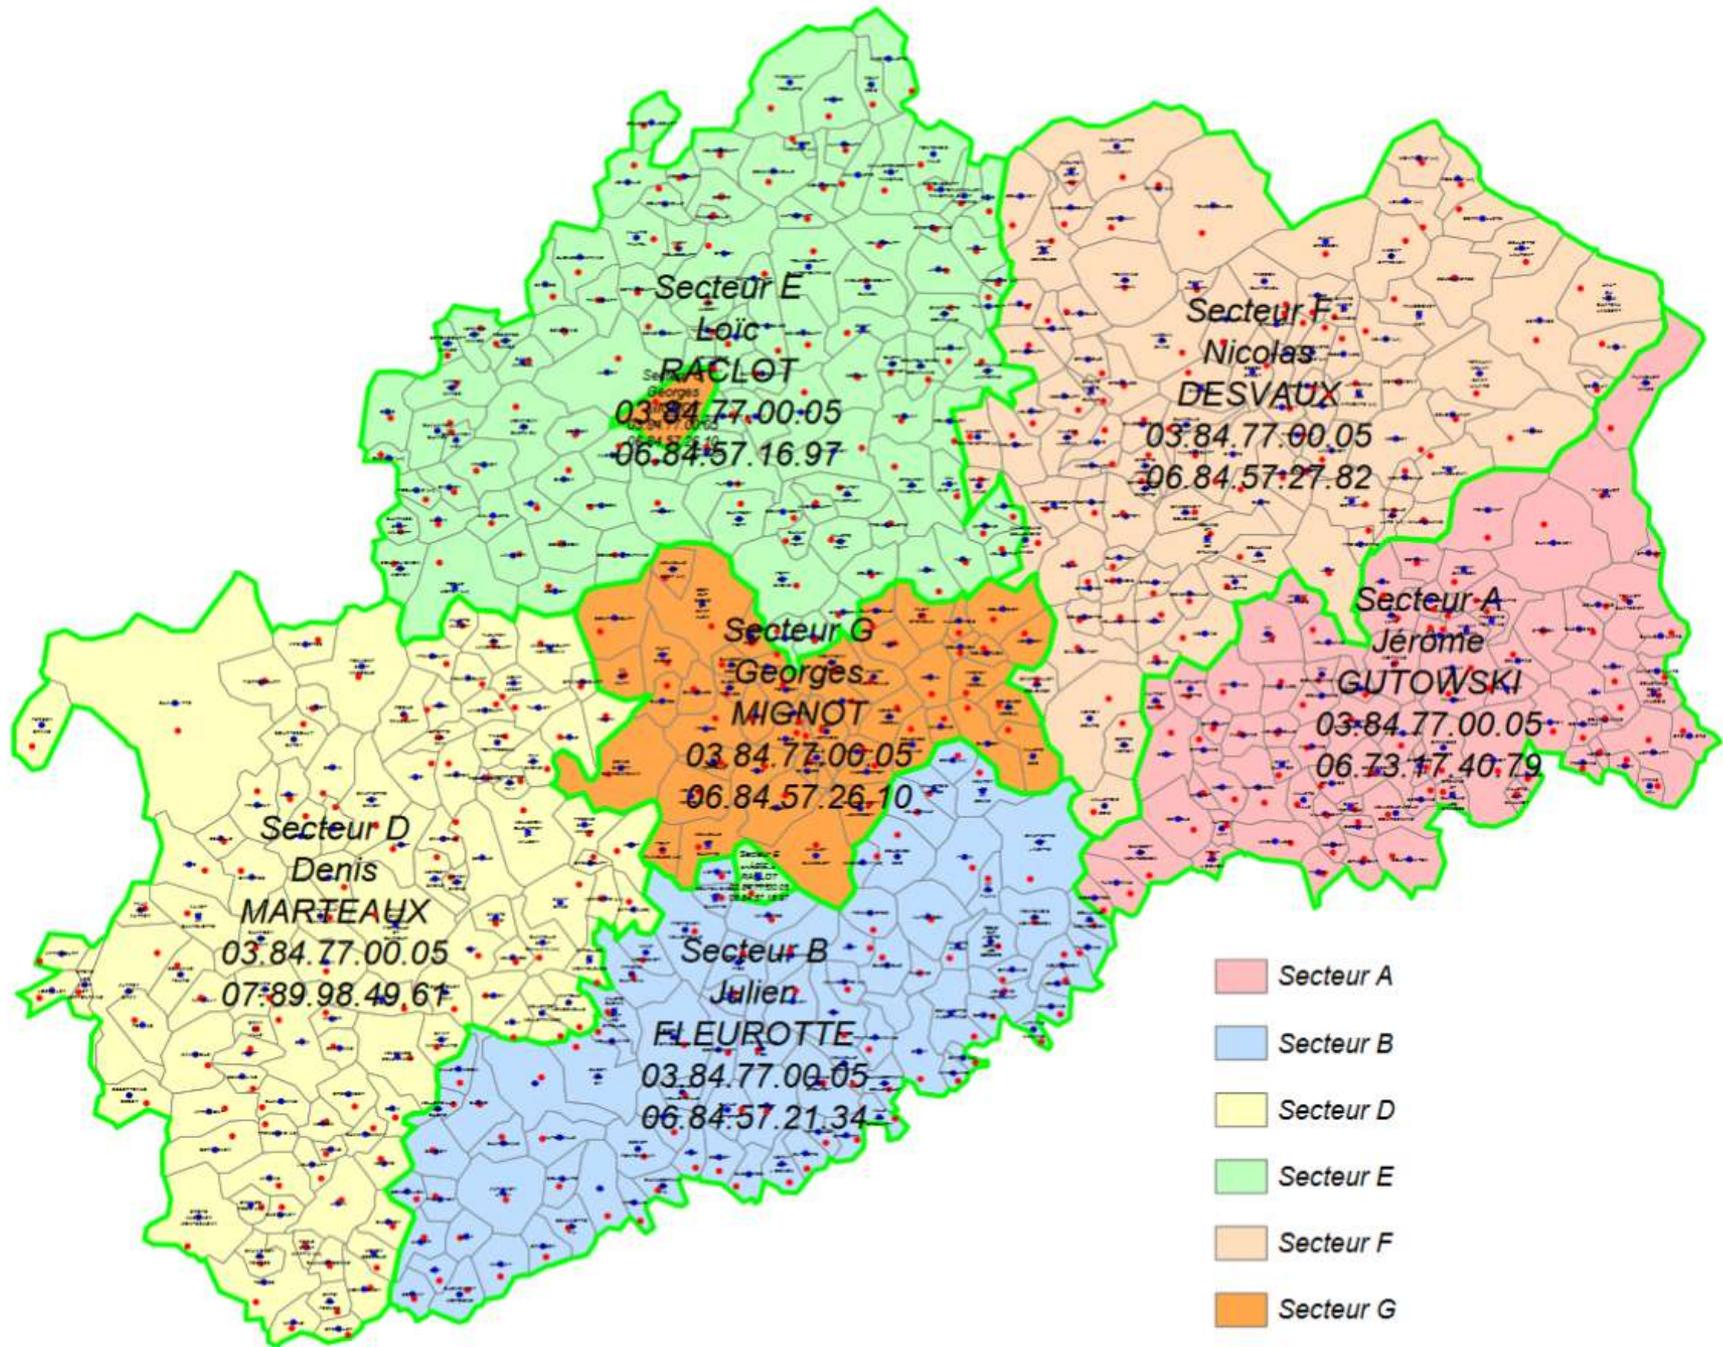


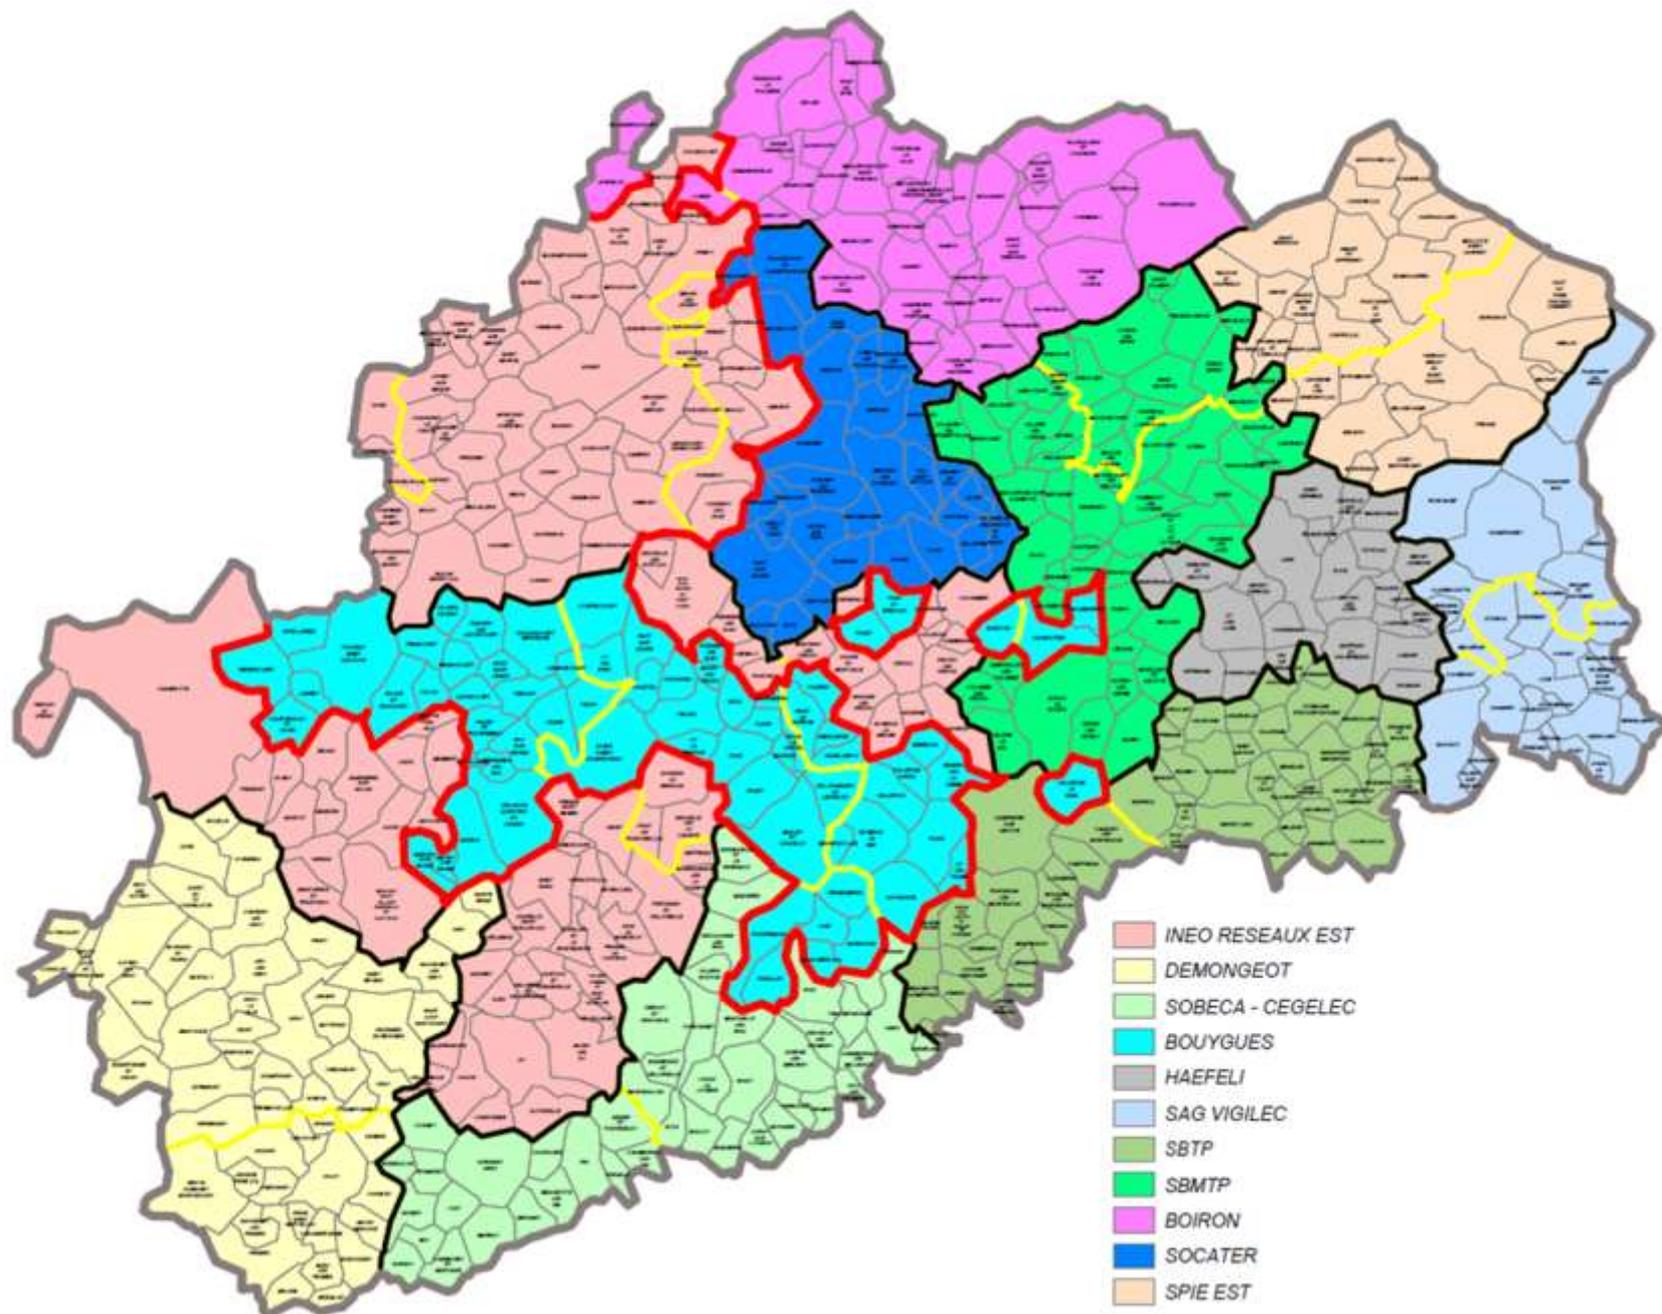

- INEO RESEAUX EST
- DEMONGEOT
- SOBECA - CEGELEC
- BOUYGUES
- HAEFELI
- SAG VIGILEC
- SBTP
- SBMTP
- BOIRON
- SOCATER
- SPIE EST

Les acteurs en présence pour les travaux

- Le maître d'ouvrage : le SIED 70
- Le gestionnaire du réseau : Enedis
 - MOA Enedis : service administratif et technique
 - BEX : bureau d'exploitation
- Les entreprises

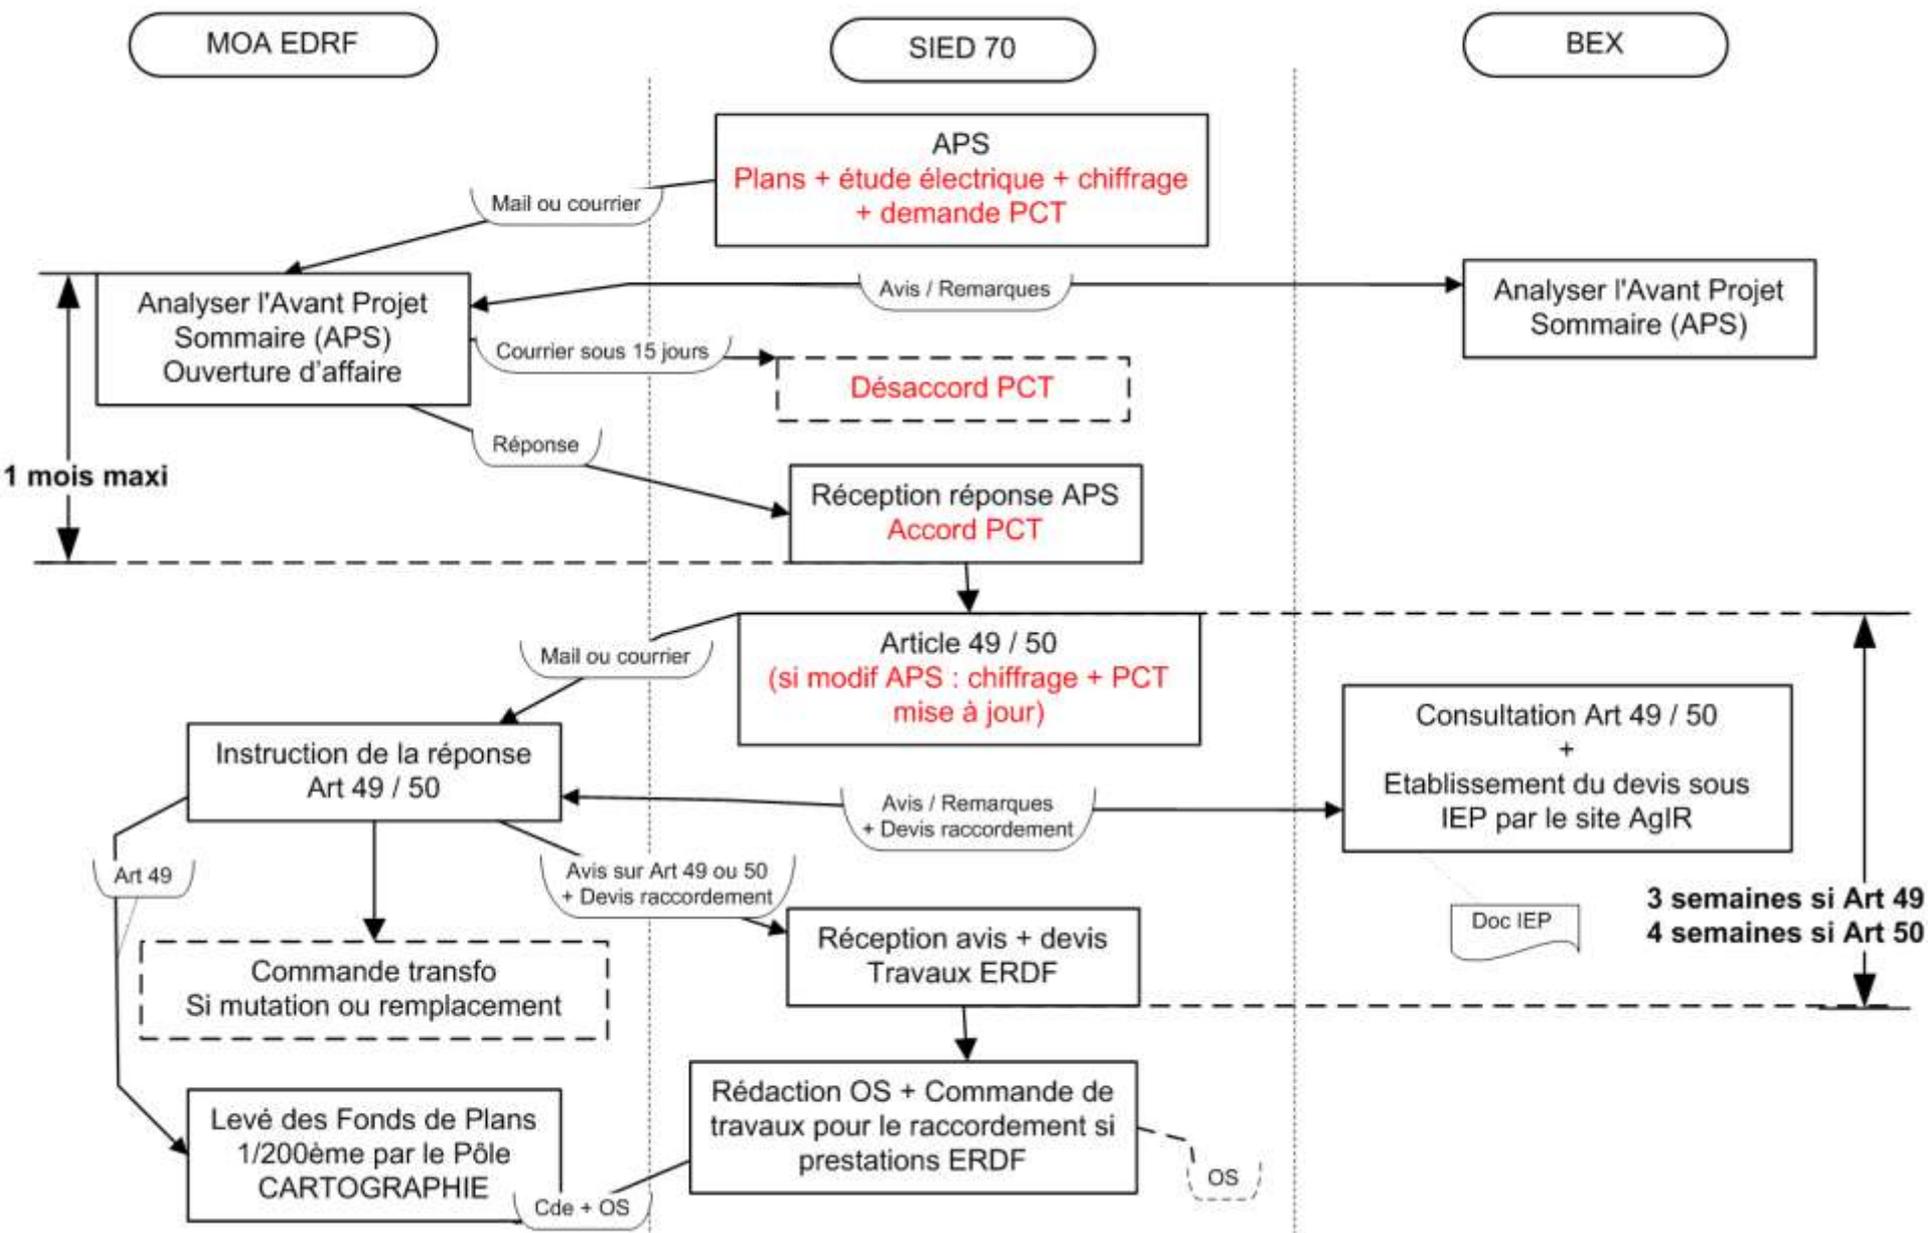

MOA EDRF

SIED 70

BEX

Suivi dossier

Contrôle travaux par échantillonnage

Immobilisation
Mise à Jour des bases cartographiques pour l'exploitation des ouvrages

DMEO

DMEO + info sur la date De début des travaux

Fonds de Plan + Fiche Poste

Avis réservation Transfo

CR contrôle

PMEO

A 56

PMEO + Art56
Plans Minute +
Fiche Poste
+ Fiche Quantitatif Travaux

Fiche QT

Entreprise travaux mandatée par le SIED 70
Préparation Travaux

Entreprise travaux mandatée par le SIED 70
Pilotage et réalisation des travaux

Entreprise travaux mandatée par le SIED 70
Fin travaux hors exploitation

Réception AMEO

Entreprise travaux mandatée par le SIED 70
Travaux raccordement
Mise sous tension

A 56

Réception Technique du chantier

Art 56 signé par le SIED 70
+ plan de récolement
+ Fiches PCT et VRG

Réception – signature ERDF Art 56
Validation PCT + VRG

Validation PCT + VRG

Art 56

PCT

Art 56

Bureau du contrôle DDE

Bordereau trimestriel PCT

DMEO

DTE

PMEO + Art56
Plans Minute

AMEO

ATST

FACTURATION

Doc IEP


Préparation mise en exploitation

Nomination RIP chantier complexe

Contrôle schéma électrique
Rédaction AMEO avec remarque si non conformité


Délivrance accès à l'ouvrage

Intervention Exploitation – (TST Si HTA)

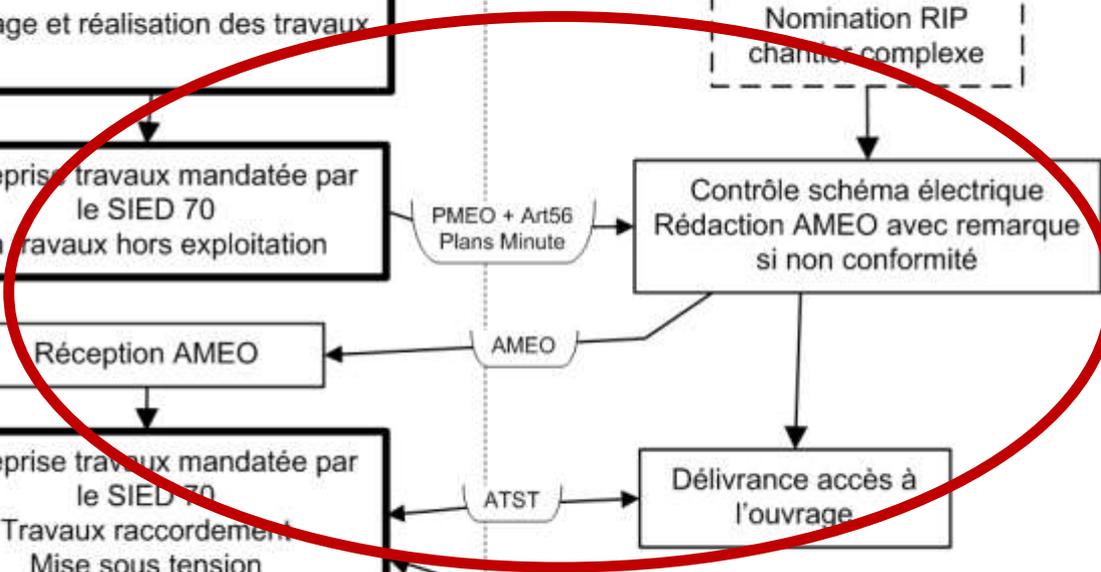

Marchés de travaux solde des marchés

En 2011, lors de la présentation des nouveaux marchés aux entreprises, le délai de versement du solde aux entreprises avait été intégré dans le délai global de réalisation, ce dernier était à priori la préoccupation majeure de l'époque.

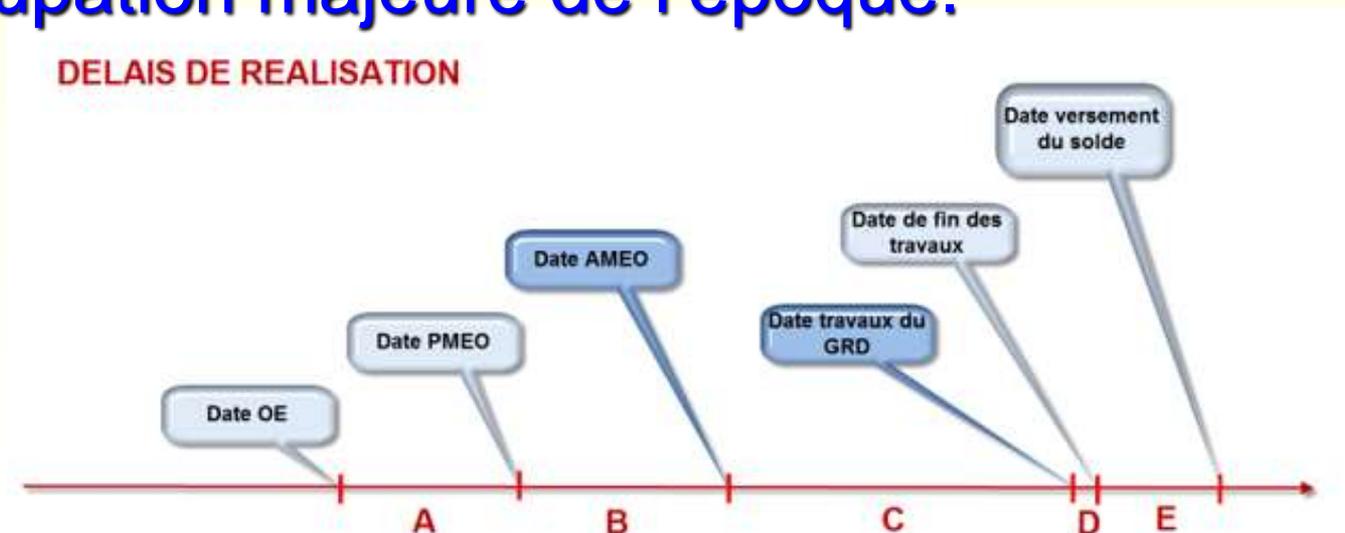

Marchés de travaux

solde des marchés

Il avait bien été précisé :

Entre la fin des travaux et le solde du dossier, les entreprises et le SIED 70 doivent veiller à limiter les délais dans la transmission de l'attestation d'achèvement de la commande (avec l'envoi de toutes les pièces qui doivent y être jointes), l'organisation de la visite préalable à la réception des travaux, la correction du projet de décompte final et l'inscription du solde sur le décompte mensuel

 Le SIED70 a œuvré pour un paiement rapide des entreprises en instaurant un acompte de paiement à 90% avant la transmission du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) qui intègre un décompte définitif.

Marchés de travaux

Bilan de l'accord cadre

- 🏗️ Statistiques entre 2013 et 2018 :
- 🏗️ 2 163 OS et 27,5 M€ mandatés
- 🏗️ le délai moyen des travaux : 129 J
- 🏗️ le délai moyen entre fin des travaux et solde : 247 J!
- 🏗️ le délai moyen de mandatement du SIED70 : 29,95 J...

Marchés de travaux

Bilan de l'accord cadre

- Une relance personnalisée a été adressée le 6 avril dernier à chaque entreprise avec une liste de dossiers à écluser pour le 27 avril 2018

Marchés de travaux

Bilan de l'accord cadre

✚ Au 20 juin 2018 :

- 71 opérations, soit 144 000 € restant à mandater, sont en attente de facture depuis + d'1 mois (DGD notifié)
- 84 dossiers, soit 836 375,79 € restant à mandater, sont en attente de notification du DGD depuis + 100J (travaux terminés)

Marchés de travaux

Bilan de l'accord cadre

- ✚ Le délai de solde des marchés est trop long
- ✚ Cette situation est préjudiciable au Syndicat à double titre :
 - financièrement : cela entraîne du retard dans la perception des recettes des travaux
 - les répercussions, tant financières qu'au niveau du service rendu sur les communes, sont déplorables

Marchés de travaux pistes d'amélioration

✚ Le Bureau du SIED70 a validé la création d'un poste administratif (mi-temps) pour la comptabilité ce qui devrait permettre de réduire la durée de mandatement du Syndicat

✚ Un point d'entrée unique est à utiliser pour la transmission des documents (hors factures) :
travaux-elec@sied70.fr

Marchés de travaux pistes d'amélioration

- ✚ Réduction de l'acompte maximum à l'AMEO (et non plus PME0)
- ✚ Pénalités pour défaut de transmission des pièces administratives à plafonner (inapplicables sinon)
- ✚ Dissocier la remise du DOE (attestation de conformité, plan de récolement) du DGD (Décompte Général Définitif)
- ✚ Retour à une procédure de fin de travaux proche de celle du CCAG mais avec des délais plus réduits

Les évolutions pour les nouveaux marchés

- ✚ Disparition du Code des marchés publics (application décret n°2016-360)
- ✚ Obligation de dématérialisation d'ici fin 2018
- ✚ Plan de récolement format shapefile
- ✚ Fin des plans de récolement papier

Questions diverses
